


1. Πρέπει από τον τοπογράφο να γίνει κάποια αποτύπωση για την αλφαδιά του δαπέδου, συγχρόνως μερικές δοκιμαστικές τομές διότι η ανισοσταθμία μπορεί να οφείλεται σε γέμισμα.



2. Πώς θα φύγουν οι αποχετεύσεις για τις τουαλέτες στο πίσω μέρος;

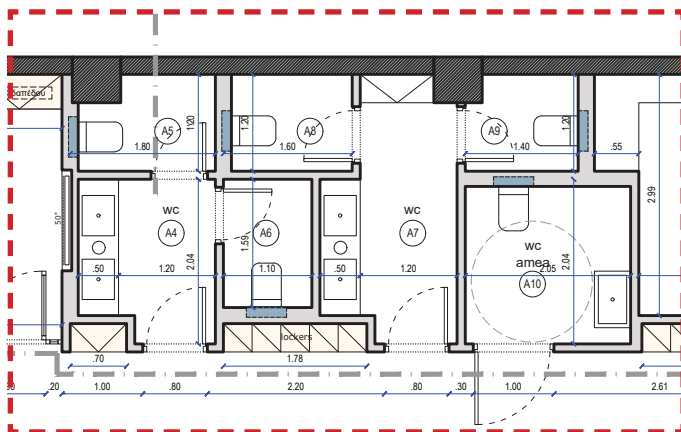

3. Μήπως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την οροφή του κάτω υπογείου, αν μπορεί να γίνει διερεύνηση από τον Πέτρο.

## ΣΤΑΤΙΚΑ

4. Τι είναι το κάτω μέρος του τοίχου που υπάρχει τώρα; Έχουμε την διαβεβαίωση του ιδιοκτήτη αλλά προτείνουμε την άμεση διερεύνηση και καθαίρεση, γιατί αν έχουμε εκπλήξεις η λύση δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Το θετικό είναι πως βλέπουμε κάποιες ρηγματώσεις δίπλα στις κολόνες, ίσως να μην είναι δοκάρι.



5. Στατικά να ελεγχθεί αν η θέση της γεννήτριας μπορεί να τοποθετηθεί στο σημείο που προτείναμε.



6. Στατικά να ελεγχθεί αν η θέση εξωτερικής μονάδας εξαερισμού μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή της εισόδου για την εφορία.



7. Στατικά να ελεγχθεί αν μπορούν να ανοίξουν παράθυρα.



8. Οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού θα τοποθετηθούν στην ταράτσα.

9. Εσωτερικά θα υπάρχουν αεραγωγοί  $\phi 35$  πίσω από την πρόσοψη και μέσα στα meeting rooms, θα είναι όσο δηλαδή η κρέμαση του δοκαριού.



10. Θα παχύνουμε τον τοίχο δίπλα στη ράμπα κατά 30εκ με εταλμπον για να περάσουν οι αεραγωγοί πέρα από το εσωτερικό δοκάρι.



11. Στο μικρό κτίσμα όπου θα γίνουν γραφεία το ύψος στο ισόγειο είναι 3.22, άρα δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τον εξαερισμό. Ο όροφος όπου φιλοξενείται η παρέα του Πέτρου δεν θα αλλάξει.



12. Στον χώρο με τις κερκίδες το δοκάρι είναι στα 2.40 και θα κατέβουμε 15 πόντους για τον εξαερισμό.



13. Να ελεγχθεί το εσωτερικό του δωματίου με τα ρολόγια της ΔΕΗ για πιθανή τροποποίηση.





7 Karaiskaki str., 15451

N. Psychico, Greece

T +30 210 6711554

**[www.wedesign.gr](http://www.wedesign.gr)**
